小牧市立小牧南小学校改築工事のうち建築工事

東急・滝特定建設工事共同企業体

月 間 工 程 表

工期　2020年8月11日 ～ 2023年3月1日

（ 2022年3月1日　作成 ）

工事概要

主構造　：RC造4F（一部S造）
建築面積：　5250.30㎡
延床面積：11340.73㎡
敷地面積：21694.67㎡
規模　：最高高さ 16.0m　最大スパン 24.0m

発注者　：小牧市総務部資産管理課
設計者　：㈱久米設計
監理者　：㈱久米設計
工事場所：小牧市若草町82番地
主用途　：普通教室、管理・特別教室、図書ｴﾘｱ、体育館、ﾌﾟｰﾙ

所長	副所長	工事長	工事長	主任	主任
岩田	松村	垣内	太田	松元	木村

種目		2月 28 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	2022年 4月 1 金	2 土	3 日
																	2022年 3月																		
行事予定				建築検査①	消防検査①				施主検査①		竣工写真		引渡①取脱①			卒業式リハ		卒業式リハ		卒業式					修了式				業務開始						内覧会
体育館棟	1～2階	軒天ｽﾘｯﾄ取付				手直し工事						是正完了確認		引越①					消防検査②	養生設置	引越②	引越③				引越④	引越⑤	引越⑥	引越⑦			養生撤去			
行事予定												環・測(普・特)				社内検査②	設計検査②		建築検査②	施主検査②			施主検査②		引渡②取脱②									
体育館棟	3～4階	軒天ｽﾘｯﾄ取付															消火器配置		竣工写真			手直し工事			是正完了確認										
特別教室棟	R階	防水押えコン					室外機廻り配管									試運転調整																			
	階段3	ノンスリップ取付							クリーニング																									
3階	廊下7	木巾木		床補修				長尺シート貼																是正完了確認										
	廊下6	壁･天井ボード			壁塗装			木巾木		床補修		長尺シート貼									手直し工事														
	配膳室	壁化粧ケイカル		天井ボード			ウォールガード			長尺シート貼																								
2階	印刷室			壁塗装		床補修		ビニルタイル貼		家具取付																									
	放送室	天井ボード	壁ｸﾘｱ塗装	器具付	消防検査①	木巾木	床補修	タイルカーペット		操作卓設置	家具取付																								
	廊下3		壁塗装		木巾木		床補修		長尺シート貼																										
	配膳室	天井ボード	木巾木	床補修		ウォールガード		長尺シート貼																										
1階	WC3	床補修		長尺シート貼		トイレブース			鏡取付	手摺取付																									
図書エリア外部	外部階段																																	
	4階	物見塔ケラバ	足場解体																															
	3階 西	塗装 下地		目地シール	ジョリパッド	足場解体	床補修																											
	東	塗装下地			目地シール	ジョリパッド	足場解体	床補修																											
	2階 西	足場解体		床補修			塗膜防水																											
	東	目地シール	ジョリパッド		足場解体		床補修																											
	1階 西	地業			土間配筋	土間コン	U字溝敷設		足場組立	目地シール	ジョリパッド	足場解体																							
	東	ジョリパッド	足場解体		地業	土間配筋	土間コン	U字溝敷設																										
図書エリア内部	吹抜																																	
	4階	天井 LGS		GW･岩綿吸音板	器具付			足場盛替	手摺付	塗装	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	床補修	床ｼｰﾄ																						
	3階																																	
	2階																																	
	1階																																	
普通教室棟	教室																																	
外構	A																																	
	B																																	
	C																																	
	D1																																	
	D2																																	
	D3																																	
	E																																	
	F																																	
	G																																	
	H																																	
	I																																	
当初出来高（%）		84.2						84.6							85.1						85.5							86.0				86.4			
計画出来高（%）		84.2						84.6							85.1						85.5							86.0				86.4			
出来高実績（%）		84.2																																
行事予定				建築検査①	消防検査①				施主検査①				引渡①取脱①			社内検査②	設計検査②		建築検査②	施主検査②			施主検査②		引渡②取脱②									内覧会
			第19回総合定例							第57回週間定例							定例なし		消防検査②	卒業式			定例なし		修了式						第58回週間定例			
騒音作業　有・無		有				有	有																											
使用重機		16～25tR、ポンプ車、0.45BH							16～25tR、ポンプ車、0.45BH							16～25tR、0.45BH															0.45BH				
工事車両　種別・台数		大型車両：15台/日							大型車両：15台/日							大型車両：15台/日															大型車両：5台/日			
月間安全目標		墜落・転落災害の防止、　建設機械・クレーン等災害の防止、　倒壊・崩壊災害の防止、　公衆災害の防止																																
週間安全目標		資材整理・不要材早期搬出の徹底							高所作業時の安全帯使用徹底							重機オペレーターとのグーパー合図の徹底							重機オペレーターとのグーパー合図の徹底							第三者災害防止の徹底				

B　盛土　スチールエッジ　路盤　AS舗装　引越・備品搬入　〈給食室ルート〉

C　引越・備品搬入　〈体育館ルート〉　＜工事用搬出入路＞　Ⅱ期工事エリア

D1　卒業式通路　板敷　カーペット敷　卒業式リハーサル　卒業式リハーサル　卒業式

D2　〈みんなのわ〉台座･手洗場構築　台座コン　手洗場構築　シンクコン　手洗場ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　躯体補修　平板舗装　庭石・客土入れ　台座デッキ敷・植栽　鋤 取　ステップ2(北側)構築　Sエッジ基礎　Sエッジ取付　路盤　AS舗装

D3　ステップ2(南側)構築　＜工事用搬出入路＞　敷鉄板撤去　Sエッジ基礎　Sエッジ取付　路盤　AS舗装

E　防球ネット・暗渠工・遊具設置　グランド舗装工　植栽

F　現場打ち擁壁構築　門扉・フェンス取付

G　＜工事用搬出入路＞　盛土・雨水工　仮囲い撤去・通路整備　引越・備品搬入　〈南東ゲート〉

H　図書エリア1F西側工事　地業　〈いきもののわ〉捨コン　底盤防水　立上り躯体　立上り防水　底盤躯体　植栽他
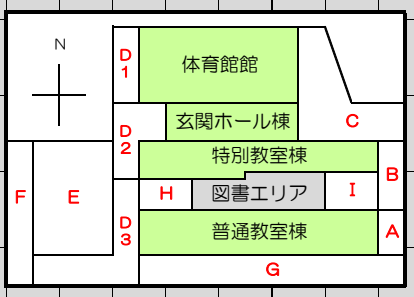
I　図書エリア1F東側工事　Bエリア工事　〈学び のわ〉捨コン　立上り　コン　土間　コン　植栽他
